


Вид на корпус 40А.
Корпус 40 Б дальний план.



Корпус 40Б.
Монтаж 18 этажа (завершение).
Кирпичная кладка 13 этажа.
Кладка перегородок 2-5, 13 этажей.
Электротехнические работы 1-5 этажей.
Штукатурные работы 4-5 этажей.
Монтаж ИТП в техподполье.
Заделка швов плит перекрытий, окраска 1-13 этажей.
Монтаж окон 11 этажа.

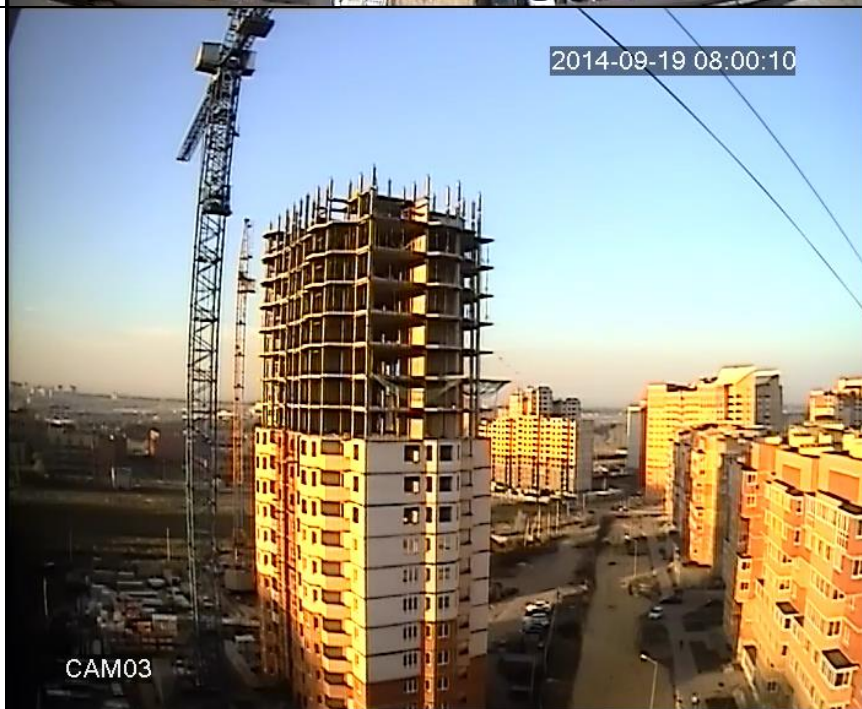

Корпус 40А.
Монтаж последнего яруса колон (завершение).
Монтаж 19 этажа и тех.этажа.
Электротехнические работы.
Штукатурные работы.
Монтаж ИТП в техподполье.
Прокладка теплосети от точки врезки городских коммуникаций к дому.




Корпус 40А.
Монтаж последнего яруса колон.
Начало монтажа 19 этажа и тех.этажа.
Электротехнические работы 8-11 этажей.
Штукатурные работы 5-9 этажей.
Монтаж ИТП в техподполье.
Прокладка сетей водопровода от здания к точке врезки городских коммуникаций.
Начало работ по прокладке теплосети от точки врезки городских коммуникаций к дому.



Корпус 40Б.
Монтаж 18 этажа.
Кирпичная кладка 13 этажа.
Кладка перегородок 8-12 этажей.
Электротехнические работы 10-12 этажей.
Штукатурные работы 2-3 этажей.
Монтаж ИТП в техподполье.
Прокладка сетей водопровода от здания к точке врезки городских коммуникаций.



Вид на корпус 40А.

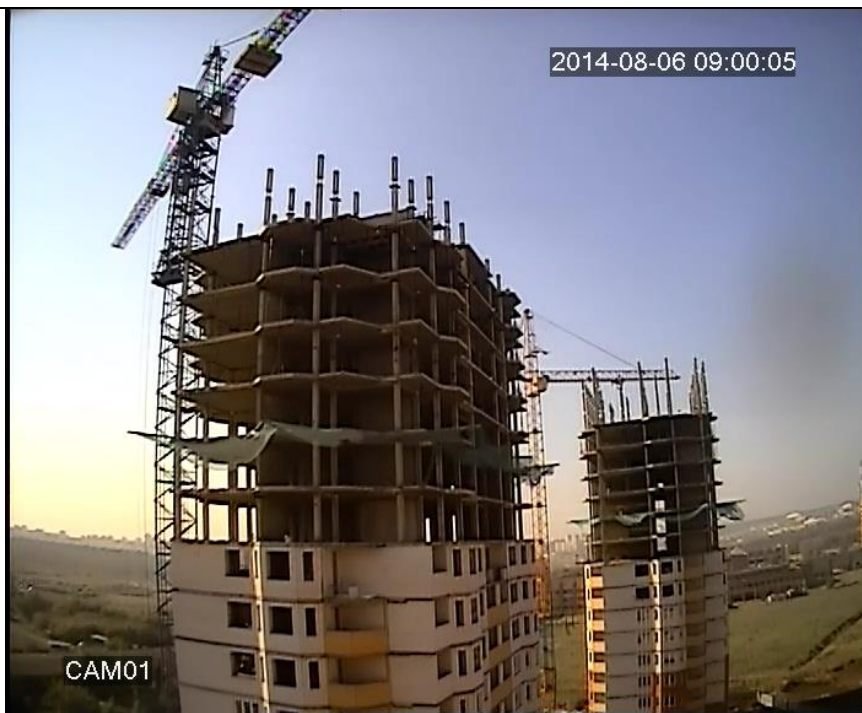

Вид на корпус 40А.
Корпус 40 Б дальний план.



Корпус 40Б.
Монтаж 16-17 этажей.
Монтаж окон 9-10 этажей.
Кирпичная кладка 11-12 этажей.
Электротехнические работы 8-9 этажей.
Подготовка техподполья для монтажа вводов тепло- и электроснабжения, водопровода, канализации, водостока, ИТП.



Корпус 40А.
Монтаж перекрытий 17-18 этажей.
Монтаж окон 7-8 этажей.
Кладка внутренних стен и перегородок 9-11 этажей.
Электротехнические работы 5-7 этажей.
Штукатурные работы 2-4 этажи.
Подготовка техподполья для монтажа вводов тепло- и электроснабжения, водопровода, канализации, водостока, ИТП.

